

EMERGENZA COVID-19 - Segnaletica

A seguito di quanto sopra, prima dell'avvio dei lavori oggetto dell'appalto, TUTTE LE DITTE dovranno redigere un addendum allegato al proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) quale riscontro al presente documento, finalizzato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione anti-contagio, al fine di impedire la diffusione del virus COVID-19.

RIFERIMENTI GENERALI

1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

a) Tipologia: PREPARAZIONE AREA DI LAVORO

b) Descrizione: BONIFICA - TERRENO ESECUZIONE RECINZIONE; ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE

c) Modalità di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili o nastro segnaletico e stabilire un percorso di massima per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la viabilità interna ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96. Identificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti e preparare il terreno provvedendo ad una bonifica del terreno e ad eliminare il ristagno delle acque meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenze ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere.

d) Interconnessioni con altri lavori: In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni.

Attrezzature e macchinari: mazza, piccone, pala Materiali: paletti metallici, travi, tavole, rete

e) Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala, urti dovuti alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduta dei materiali con conseguente schiacciamento.



f) Misure provvisorie: Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo idonee andature con larghezza non inferiore a mt 0,8 per il transito di uomini ed a mt 1,20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a mt 0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali operazioni di installazione.

g) Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza

h) Riferimenti normativi: D.Lgs 493/96 - D.Lgs 626/94 integrato con D.Lgs 242/96 - D.Lgs 277/91 - D.Lgs 81/08 - D.Lgs 106/09 e s.m.i.

NOTE

- L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni.
- L'altezza della cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio.
- Segnalare tempestivamente gli ingombri sulla strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada.
- In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza.

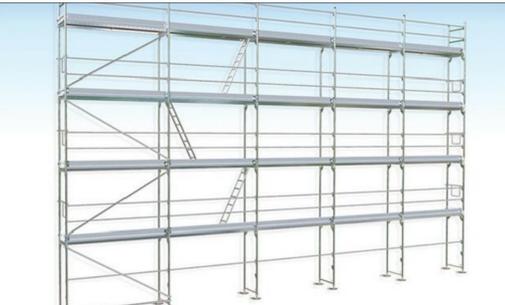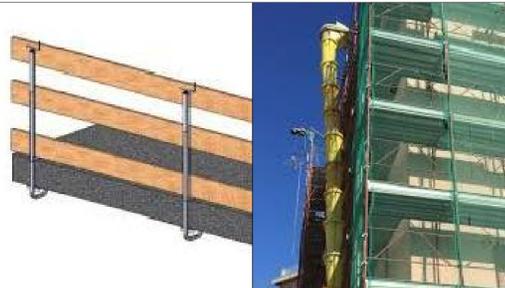

	AREA DI STOCCAGGIO E DEPOSITO MATERIALI
	CASTELLO DI TIRO
	PONTEGGIO
	PASSERELLE PROVVISORIE/DEFINITIVE
	QUADRO ELETTRICO CANTIERE
	COLONNA DI SCARICO
	CASSETTE PER RIFIUTI
	BETONIERA
	DELIMITAZIONE CANTIERE RECINTATO DA RETI AD ALTA VISIBILITA' E RESISTENZA DI COLORE ROSSO
	PARAPETTI PROVVISORI
	PUNTO DI RACCOLTA - LUOGO SICURO

LEGENDA

	1 INGRESSO
	2 USCITA
	3 BOX - UFFICI INFERMERIA
	3a AREA SANIFICAZIONE
	4 MENSA
	5 SPOGLIATOIO
	6 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
	7 QUADRO ELETTRICO GENERALE
	8 AREA CARICO SCARICO
	9 AREA STOCCAGGIO MATERIALI
	10 AREA STOCCAGGIO RIFIUTI
	11 DEPOSITO ATTREZZATURE
	12 FORNITURA DI ACQUA
	AREA DI CANTIERE RECINZIONE DI CANTIERE (PANNELLI IN LAMIERA h = 2,0 m)
	PARAPETTI PROVVISORI
	AREA DI INTERVENTO
	VIABILITA' DI ACCESSO
	VIABILITA' PEDONALE

	Estintore
	Non gettare materiale dai ponteggi
	Non salire o scendere all'esterno dei ponteggi
	Non passare sotto ponteggi o carichi sospesi
	E' obbligatoria la cintura di sicurezza

PLANIMETRIA DI CANTIERE



peba studio
ingegneria o architettura

via Vittorio Alfieri, 28 | 50121 - Firenze
 Cell: +39 340 3404707 | +39 339 4468791
 Tel: +39 055 5351621 | Fax: +39 055 5609213
 E: info@pebastudio.com

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

COMUNE DI AREZZO
via A. da Sangallo - via F. Gamurrini - via B. Buozzi

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA PRIMA E SECONDA GALLERIA DEL CIMITERO MONUMENTALE DI AREZZO

LAYOUT DI CANTIERE

DATA	SCALA	TAVOLA	ALLEGATO
11/06/2020	1:100	2	D
REVISIONE			
1	TECNICO		
Geom. SIMONE PECCHIOLI		timbro e firma del TECNICO	
AREZZO MULTISERVIZI sr.l		timbro e firma del COMMITTENTE	
